

9. PLANEJAMENTO DO PROJETO

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

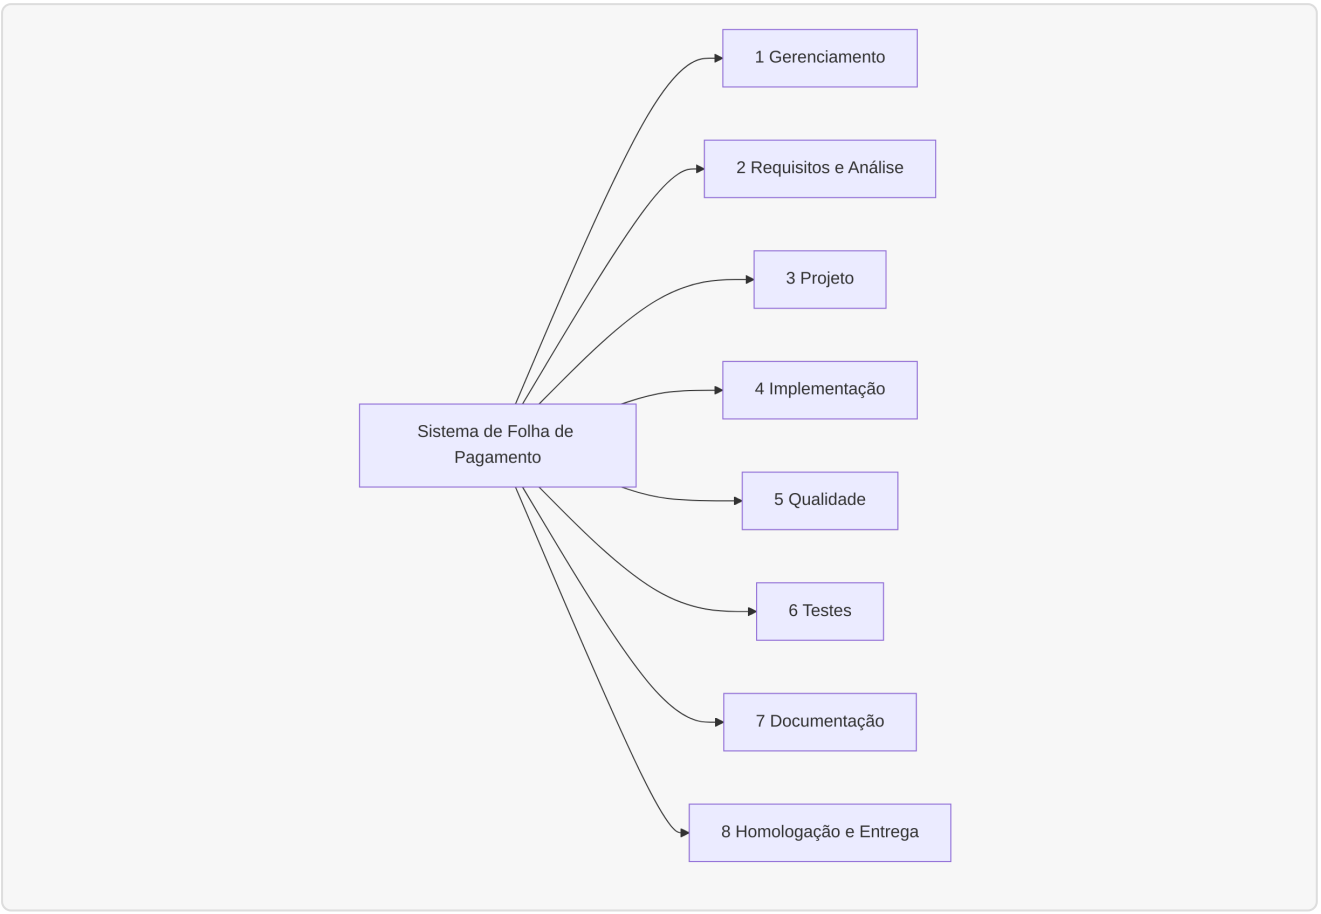

Código	Pacote de trabalho	Entregáveis
1	Gerenciamento	Planejamento, cronograma e distribuição de responsabilidades
1.1	Planejamento e cronograma	EAP e cronograma
1.2	Responsabilidades	Distribuição de papéis
1.3	Acompanhamento	Reuniões e controle do andamento
2	Requisitos e Análise	Documento de Visão, ERS e modelos UML
2.1	Documento de Visão	Objetivo, escopo, stakeholders, premissas, restrições e benefícios
2.2	ERS e rastreabilidade	Requisitos, regras de negócio, critérios de aceitação e matriz
2.3	Casos de uso e UML	Diagramas de casos de uso, classes e sequência
3	Projeto	Documento de Arquitetura
3.1	Arquitetura	Camadas, tecnologias, justificativas e arquitetura alvo do cálculo
3.2	Modelo de dados	Estrutura do arquivo JSON
4	Implementação	Sistema funcional
4.1	Cadastro e manutenção	Cadastrar, consultar, alterar e excluir colaboradores
4.2	Cálculo de salários	Cálculo por categoria e extração para as classes
4.3	Persistência	Gravação e leitura em JSON
4.4	Relatórios	Folha de pagamento e resumo
4.5	Validações	Regras de negócio e tratamento de entradas
5	Qualidade	PGQ, revisões e métricas
5.1	PGQ	Padrões, controle de versão e critérios
5.2	Revisões técnicas	Atas e registros de revisão
5.3	Métricas	Indicadores de qualidade
6	Testes	Plano, casos, execução e defeitos
6.1	Plano de testes	Estratégia, ambiente e critérios
6.2	Casos de teste	Especificação dos casos
6.3	Testes unitários	Código dos testes e cobertura
6.4	Testes de integração	Persistência, fluxos e relatórios
6.5	Testes de aceitação	Cenários, resultado esperado, obtido e situação
6.6	Defeitos	Registro e acompanhamento
7	Documentação	Manuais
7.1	Manual do usuário	Instalação, configuração, operação e relatórios
7.2	Manual técnico	Arquitetura, modelo de dados, código e manutenção
8	Homologação e Entrega	Termo, relatório final e apresentação
8.1	Termo de homologação	Declaração formal de atendimento aos requisitos
8.2	Relatório final de qualidade	Situação dos requisitos, resultados, métricas e conclusões
8.3	Repositório e estrutura de entrega	README, histórico e organização das pastas
8.4	Apresentação	Demonstração do sistema

Cronograma

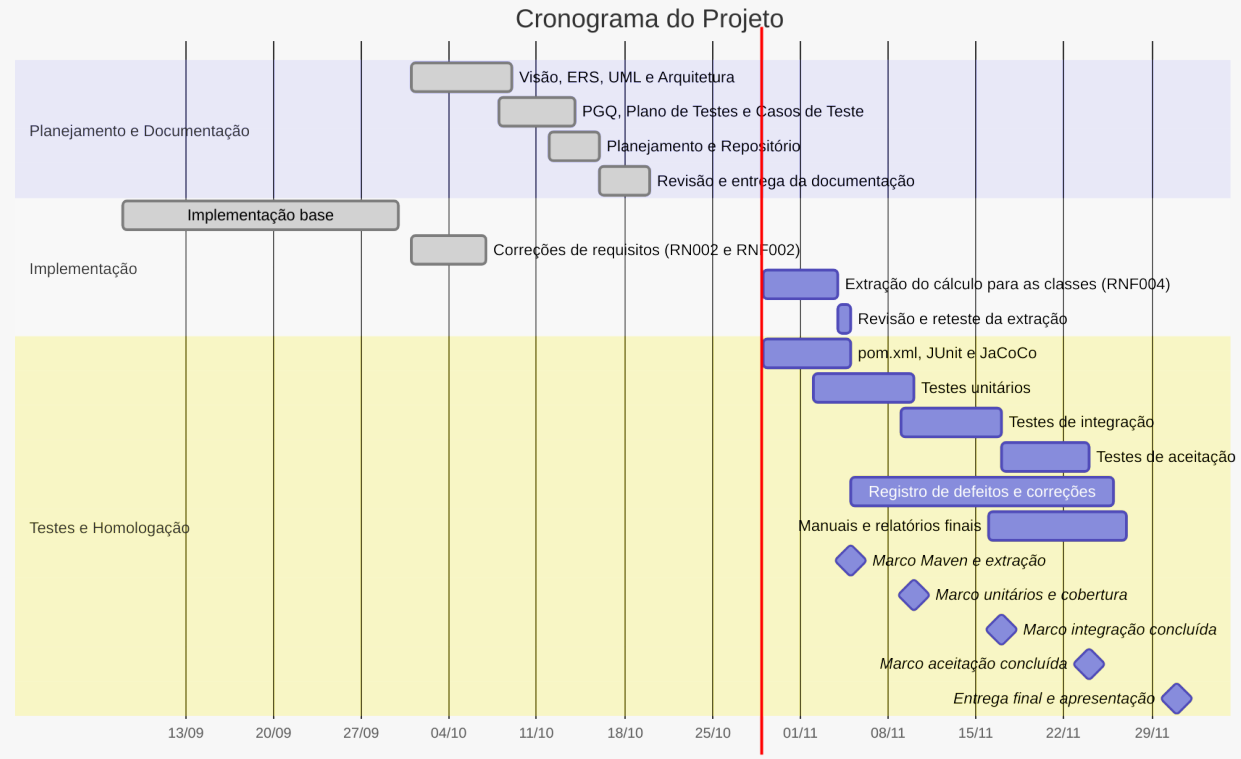

Marcos e verificação

Marco	Data	Verificação
Entrega e apresentação da documentação	20/10/2026	Documentação e repositório entregues
Maven e extração do cálculo concluídos	05/11/2026	`mvn test` executa; CT002 a CT010 repetidos; REV-01 reinspecionada
Testes unitários concluídos	10/11/2026	Cobertura de linhas de 80% ou mais no JaCoCo; CT002 a CT004 e CT011 a CT017 executados
Testes de integração concluídos	17/11/2026	CT001 e CT005 a CT010 executados; defeitos registrados
Testes de aceitação concluídos	24/11/2026	CT018 a CT021 e cenários dos critérios de aceitação executados, com evidências
Defeitos críticos e altos corrigidos	26/11/2026	Nenhuma Issue crítica ou alta aberta
Manuais e relatórios finais prontos	27/11/2026	Manual do usuário, manual técnico, relatório de testes e matriz atualizada
Entrega final e apresentação do sistema	01/12/2026	Critérios de aprovação do PGQ cumpridos

Fase	Atividades	Início	Fim
Planejamento e documentação	Visão, ERS, UML, arquitetura, PGQ, plano e casos de teste, planejamento e repositório	01/10/2026	20/10/2026
Implementação	Implementação base, correções de requisitos e extração do cálculo	08/09/2026	05/11/2026
Testes e homologação	Infraestrutura de testes, testes unitários, de integração e de aceitação, defeitos, manuais e relatórios	29/10/2026	01/12/2026

Distribuição de Responsabilidades

Integrante	Papel	Responsabilidades	Pacotes da EAP
Matheus Danoski Petuco	Documentação	Consolidar e revisar a documentação, gerar os documentos finais e manter a matriz de rastreabilidade	1, 2, 7
Felipe de Miranda Borba	Desenvolvimento	Implementar e corrigir o sistema, extrair o cálculo, manter o build e escrever as instruções de instalação	3, 4
João Gabriel da Cunha	Testes	Escrever e manter os testes unitários e executar os testes de aceitação	6.3, 6.5
João Paulo Teobaldo da Silva	Testes	Escrever os testes de integração, executar os casos de teste e registrar os defeitos	6.2, 6.4, 6.6
André Sergeievich Jaeger	Qualidade e repositório	Conduzir o PGQ, revisar Pull Requests, acompanhar as métricas e manter o README e a estrutura de entrega	5, 8.1 a 8.4

Todos os integrantes participam das revisões técnicas e da apresentação. O código é revisado por um integrante diferente do autor, conforme o processo do PGQ.

10. REPOSITÓRIO DO PROJETO

Repositório

O projeto é mantido no GitHub, em `https://github.com/felipeborba1110/T1_Qualidade`, com a `main` como branch principal e a integração das mudanças feita por Pull Requests, conforme o PGQ.

README


O arquivo `README.md` na raiz do repositório contém:

Seção	Conteúdo
Descrição e funcionalidades	Objetivo do sistema e o que ele faz
Tipos de colaborador	Padrão, comissionado e por produção, com as fórmulas de cálculo
Regras de negócio	Matrícula única, nome obrigatório, valores não negativos e cálculo automático
Requisitos	Java 15 ou superior e `json-simple-1.1.1.jar`
Como compilar e executar	Comandos reais para Windows, Linux e macOS e a localização do `data.json`
Como usar	Opções do menu
Testes	Como executar os roteiros manuais hoje e o estado do Maven, JUnit e JaCoCo (planejados)
Estrutura do projeto	Organização das pastas
Padrão de commits	Tipos e formato das mensagens
Equipe	Integrantes e papéis

Histórico de Commits

O histórico do repositório registra a evolução do sistema por commits e Pull Requests numerados, incluindo as correções vinculadas aos requisitos (como `fix: valida nome obrigatório (RN002)` e `fix: trata entradas não numéricas (RNF002)`). As mensagens seguem o padrão `tipo: descrição` definido no PGQ, e o histórico completo pode ser consultado com o comando `git log`.

Estrutura Inicial do Projeto

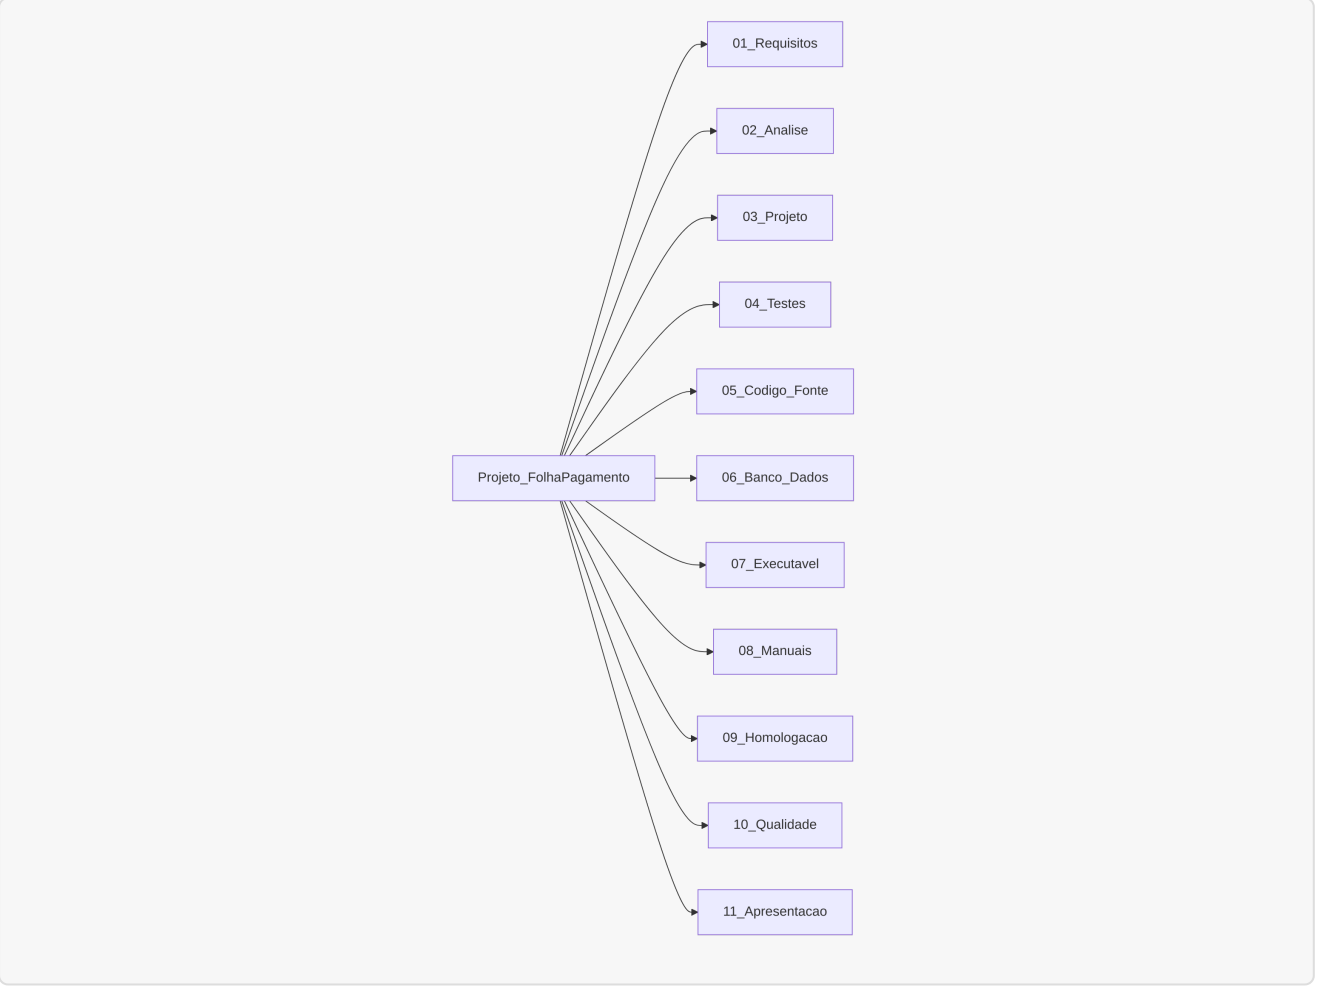

Pasta	Conteúdo	Situação
`01_Requisitos`	Documento de Visão e ERS (seções 1 e 2 deste documento)	Disponível
`02_Analise`	Casos de uso e diagramas UML (seções 3 e 4)	Disponível
`03_Projeto`	Documento de Arquitetura (seção 5)	Disponível
`04_Testes`	Plano de Testes e Casos de Teste (seções 7 e 8)	Disponível; código e relatórios de execução serão adicionados
`05_Codigo_Fonte`	Código-fonte, `json-simple-1.1.1.jar` e instruções de instalação	Disponível
`06_Banco_Dados`	Estrutura e exemplo do arquivo `data.json`	Disponível
`07_Executavel`	Pacote executável (`.jar`)	Reservada para a entrega final
`08_Manuais`	Manual do usuário e manual técnico	Reservada para a entrega final
`09_Homologacao`	Termo de homologação	Reservada para a entrega final
`10_Qualidade`	PGQ e planejamento do projeto (seções 6 e 9); atas, defeitos e métricas serão adicionados	Disponível
`11_Apresentacao`	Material da apresentação	Disponível
